


Bryggeamfiet - Litjvika




Ny tribune for Stjørna Teaterlag – Bryggeamfiet Litjvika
Fremdriftsplan
Finansiering og budsjett


Hvordan blir det i 2021 – Nytt amfi

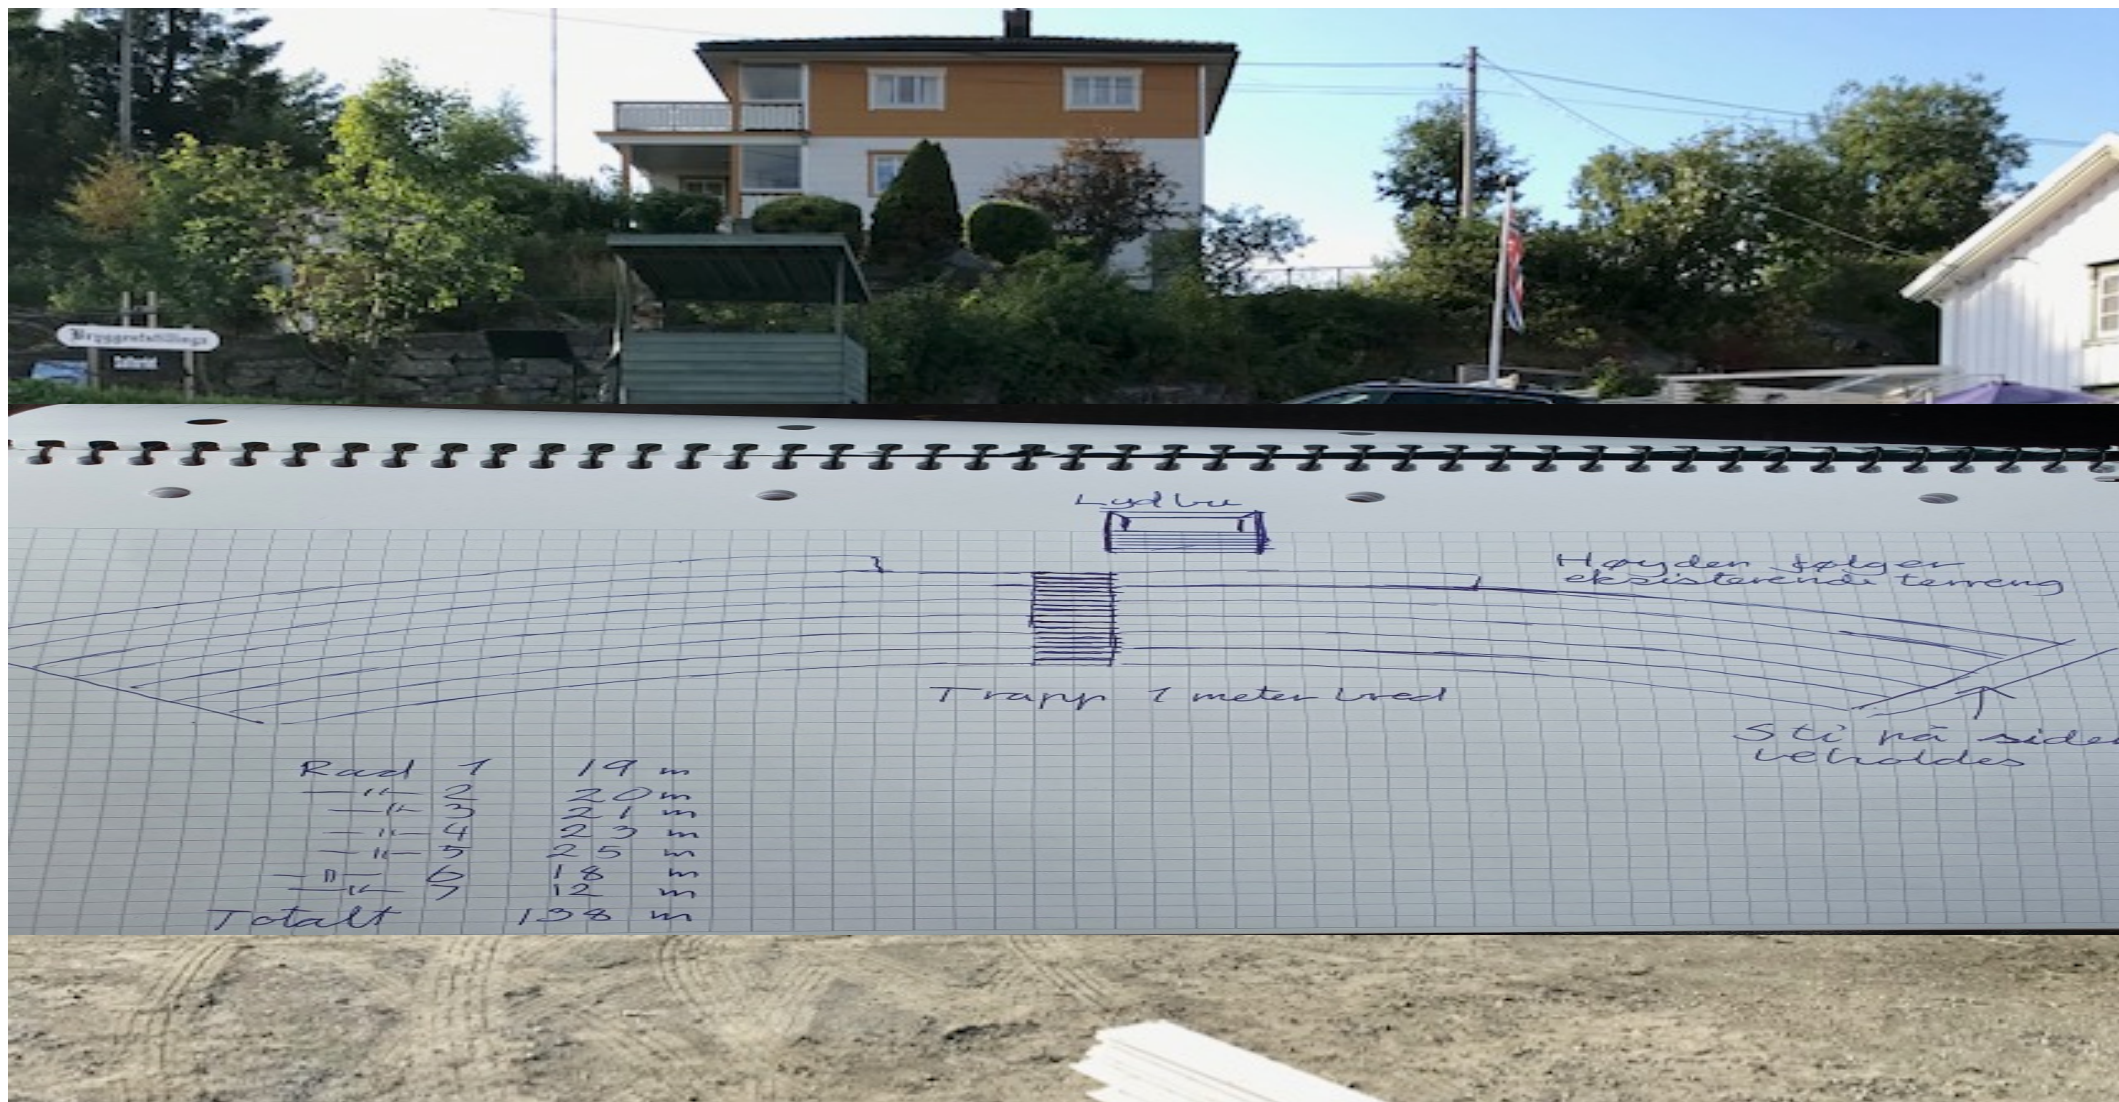

NY TRIBUNE; Eksempelskisse

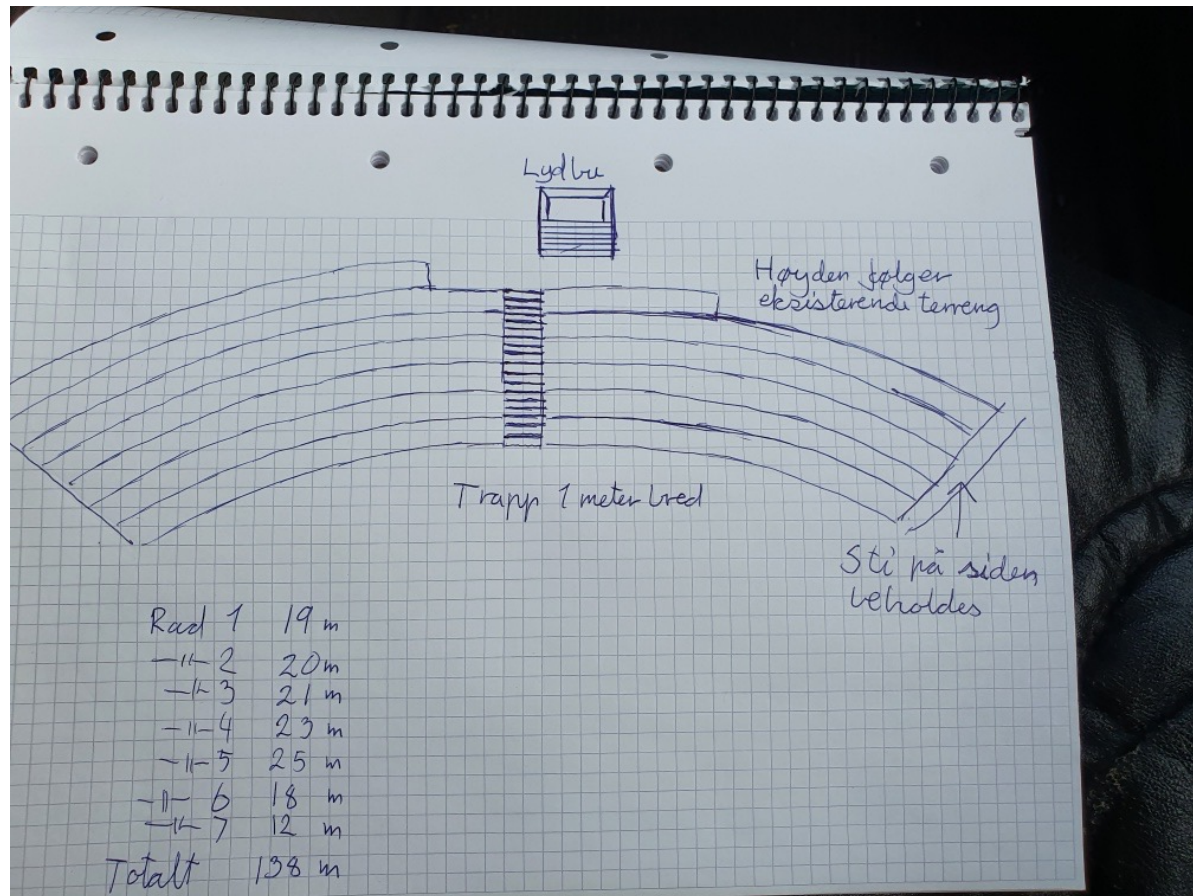

Ekstratribuner kan settes opp mot
bakarstua. I tillegg kan vei benyttes.

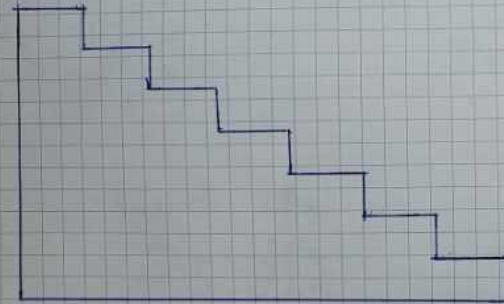

Høyde 48 cm hver asats
Dybde 80 cm — 11 —



Prosjekt Bygging av AMFI i Litjvika:

1) Fremdrifts- og Finansieringsplan (budsjett), Stjørna Teaterlag for bygging av nytt tribuneanlegg

Viser til tidligere vedlegg ad. saken:

Vedlegg 1 – Leiekontrakt Bryggeamfiet 7114 Råkvåg, klar for signering forutsatt pkt.1.

Vedlegg 2 – Kostnadsramme fra AnleggsArbeid AS. Se kostnadsstrøm i byggeperioden, Klar for signering forutsatt foregående punkter.

Vedlegg 3 – Plansak for Notholmen amfi, jf. reguleringsplan fra 1986

Fremdrifts- og Finansieringsplan (budsjett),

Aktivitet	Sept-20	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Mai-21	Jun-21	Juli-21
Styre- møte	18.9.20										
Leie- kontrakt	30.9.20										
Anleggs- kontrakt	30.9.20										
Fase 1 Byggestart		XXXX 30%	XX								
Fase 2 (vinter)				XX Slakke							
Fase 3 Halvveis					XX 30% Slakke	Frist 31.1.21					
Fase 4 Ferdigstilt							----- Slakke	----- Slakke	XXXX	XX 40%	Frist 1.6.2021

Faser i byggeprosjektet, ny AMFI(budsjett),

Faser i byggeprosjektet	Nye amfi i Litjvika	Kostnad (eks mva=	Finansieres ved:
Fase 0 (1.10.2020)	Planfase	0	dugnad
Fase 1 (1.10 – 1.11.20)	Oppstart, henting av stein fra Fiksdal og oppstart i Litjvika.	30% av anleggskontrakt Kr. 108.750,-	Tilskudd fra sponsorer, Indre Fosen
Fase 2 2.11.20 – 30.1.21)	Oppmuring av skiferstein		(Stein må hentes før vinter og tele blir utfordrende)
Fase 3 1.2.21-1	Ferdigstilling av seter, trapp mm.	30% av anleggskontrakt Kr. 108.750,-	Tilskudd fra sponsorer, egne midler i Teaterlaget.
Fase 4 1.2.21 – 1.6.21	Ferdigstilt amfi	40% av Anleggskontrakt Kr. 145.000,-	(Hele anleggskontrakt er) På totale kostnader: Kr. 362.500,-
