

Salverapport

Parsell: ekstra salve for mur del 2
Sprengningsplan: Hoved
Salve ID: 1339
Salve Nr: 13
Bergsprenger: Joakim Dyrendal
GPS-posisjon: UTM33 Ø 228582,53 N 7068831,25
Planlagt skutt: 16.12.2020 11:00:00
Faktisk skutt: 16.12.2020 11:00:00
Salveplan opprettet: 16.12.2020 10:22:37
Salverapport opprettet: 16.12.2020 17:43:09
Revisjonstidspunkt: 16.12.2020 17:43:09
Revisjonsnummer: 1 / 1
Frie sider: Ingen

Kommentarer til revisjon:
Original salverapport

Salvedata

		Salvehull		
				
		<i>Plan Rapport Avvik</i>		
Borediameter	mm	54	32	22
Forsetning	m	0,80	0,80	0,00
Hullavstand	m	0,80	0,80	0,00
Underboring	m	0,10	0,10	0,00
Fordemming	m	0,60	0,60	0,00
Hull pr detonasjon	stk	1	1	0
Hullhelling	grader	0,0	0,0	0,0
Bunnladning				
Patrondimensjon	mm	40	40	0
Patronlengde	mm	500	500	0
Patronvekt	gram	1000	1000	0
Patroner pr hull	stk	0,1	0,1	0
Pipeladning				
Densitet	kg/l	0,85	0,85	0,00
Patronlengde	mm	0	0	0
Patronvekt	gram	0	0	0
Lengde mellomdekk	m	0,0	0,0	0,0

Hulldata

Salvehull		
		
Rast	Antall hull	Boredybde
1	2	0,8
2	2	0,8
3	2	0,8
4	2	0,8
5	2	0,8
6	2	0,8
7	2	0,8
8	2	0,8
9	2	0,8
10	2	0,8

11 2 0,8

Rystelsesmåling

Max ladning per intervall: 0,20 kg

Denne salva har ingen måleverdier.

Øvrig informasjon

Planlagte tiltak

Området evakueres for folk. Salven varsles med sirene. Montert rystelsesmåler på nabohus. Dekkes med 2-3 lag skytematter.

Salvens forløp

Salven er visuelt kontrollert og alt gikk bra.

Informasjon om produktforbruk

Ingen kommentar til produktforbruk

Beregninger

Salvehull

Teoretiske verdier

		Plan	Rapport	Diff
Antall hull	stk	34	22	12
Boremeter	m	27,2	17,6	9,6
Volum	m ³	7,6	4,9	2,7
Volum inkl. UB	m ³	8,7	5,6	3,1
Areal overside	m ²	10,9	7,0	3,8
Vekt (1,6 t/m ³)	tonn	12,2	7,9	4,3
Sprengstofforbruk	kg	14,8	4,5	10,4
Bunnladning	kg	3,4	2,2	1,2
Pipeladning	kg	9,9	2,3	7,7
Bulksprengstoff rundt bunnladning	kg	1,5	0,0	1,5
Spesifikk ladning	kg/m ³	1,95	0,90	1,04
Spesifikk ladning inkl. UB	kg/m ³	1,7	0,8	0,9
Max ladning pr int.	kg	0,4	0,2	0,2

Faktiske verdier

Boremeter	m	-	17,6	-
Sprengstofforbruk ⁽¹⁾	kg	-	3,6	-
Spesifikk ladning ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,73	-
Spesifikk ladning inkl. UB ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,64	-
Densitet ⁽³⁾	kg/l	-	0,00	-
Avvik teori / faktisk		-	0,0	-
Boremeter	m	-	0,9	-
Sprengstofforbruk	kg	-	0,17	-
Spesifikk ladning ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,15	-
Spesifikk ladning inkl. UB ⁽²⁾	kg/m ³	-		-


Fotnoter:

(1) - Faktisk sprengstofforbruk baserer seg på angitt produktforbruk hvor sprengstoffmengde er hentet fra et produktregister

(2) - Spesifikk ladning benytter teoretisk volum som divisor

(3) - Kun aktuelt dersom det benyttes bulk (anfo eller emulsjon) i pipeladning. Verdien baserer seg på angitte mengder bulksprengstoff fordelt på tilgjengelig hullvolum i pipeladning.

Posteplan

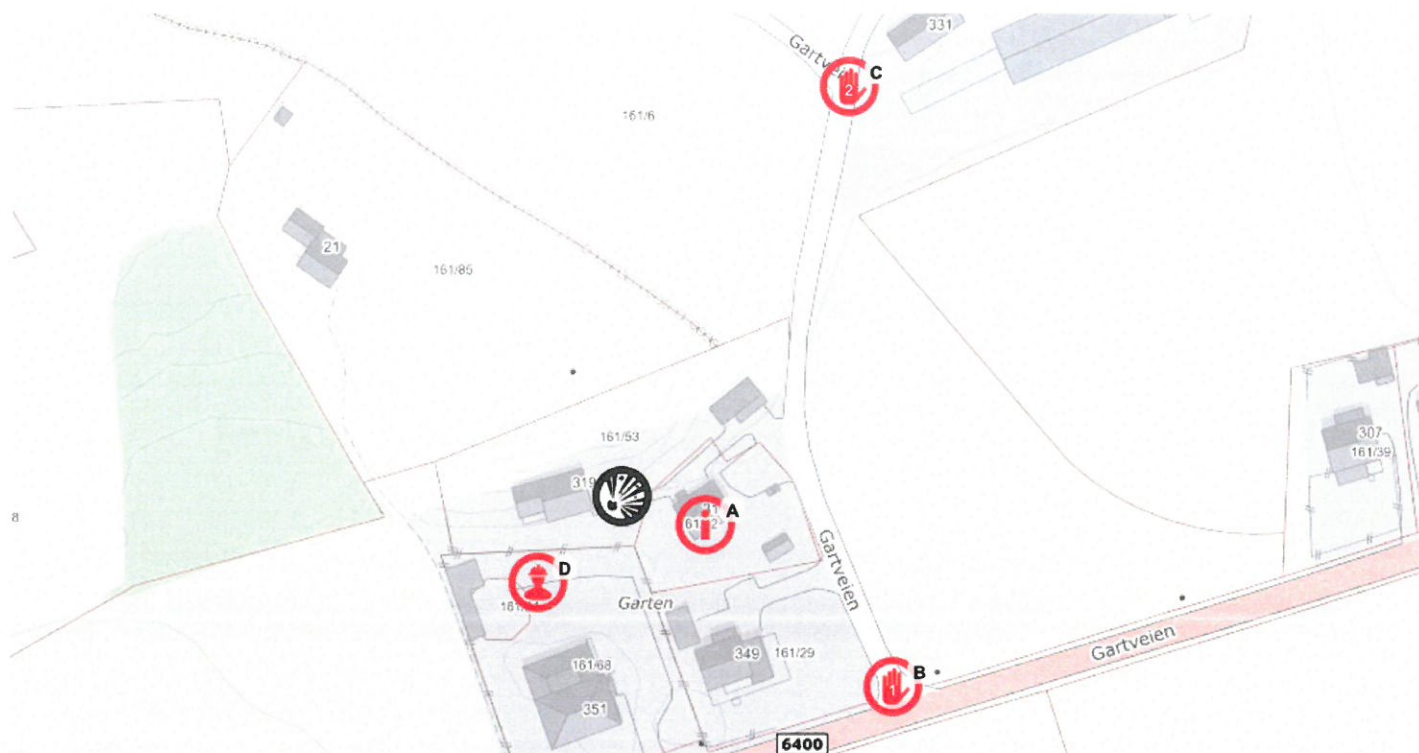

Referanse	Symbol	Instruks / Info	Person
A		Notat	
B		Post 1	
C		Post 2	
D		Bergsprenger	

Produktforbruk

Produkter

Varenr	Produktnavn	Mengde	Enhet
2403	Indetshock - 500 ms -7,8 m	22,0	stk
2506	Koblingsblokk - 42	11,0	stk
2631	Starter - 50	1,0	stk
1317	Minex - Plastpølser - 43 x 550	3,6	kg

Boremeter

Borediameter	Beregnet/teoretisk Boremeter boremeter (m) fra rigg (m)	Differanse
38	17,6	0,0

SMS varslingslogg til naboer og berørte parter

Det er ikke sendt ut SMS varslingslogg til berørte parter.

Kastlengder

Retning	Vurdert	Registrert	Differanse
Front	5,0	0,0	-5,0
Bak	0,0	0,0	0,0
Venstre	0,0	0,0	0,0
Høyre	5,0	0,0	-5,0

Kastlengder gjelder etter tiltak er utført.

Tennerplan

Salve ID: 1339. Parsell: ekstra salve for mur del 2

■ 42

