

Salverapport

Parsell: Ekstra salve for mur
 Sprengningsplan: Hoved
 Salve ID: 1334
 Salve Nr: 12
 Bergsprenger: Joakim Dyrendal
 GPS-posisjon: UTM33 Ø 228580,81 N 7068831,40
 Planlagt skutt: 14.12.2020 09:15:00
 Faktisk skutt: 14.12.2020 09:15:00
 Salveplan opprettet: 14.12.2020 08:37:42
 Salverapport opprettet: 16.12.2020 17:41:39
 Revisjonstidspunkt: 16.12.2020 17:41:39
 Revisjonsnummer: 1 / 1
 Frie sider: Ingen

Kommentarer til revisjon:
 Original salverapport

Salvedata

		Salvehull		
				
		Plan Rapport Avvik		
Borediameter	mm	54	32	22
Forsetning	m	0,80	0,80	0,00
Hullavstand	m	0,80	0,80	0,00
Underboring	m	0,10	0,10	0,00
Fordemming	m	0,60	0,60	0,00
Hull pr detonasjon	stk	1	1	0
Hullhelling	grader	0,0	0,0	0,0
Bunnladning				
Patrondimensjon	mm	40	40	0
Patronlengde	mm	500	500	0
Patronvekt	gram	1000	1000	0
Patroner pr hull	stk	0,1	0,1	0
Pipeladning				
Densitet	kg/l	0,85	0,85	0,00
Patronlengde	mm	0	0	0
Patronvekt	gram	0	0	0
Lengde mellomdekk	m	0,0	0,0	0,0

Hulldata

Salvehull		
		
Rast	Antall hull	Boreddybde
1	1	0,8
2	1	0,8
3	1	0,8
4	1	0,8
5	1	0,8
6	1	0,8
7	1	0,8
8	1	0,8
9	1	0,8
10	1	0,8

11	1	0,8
12	1	0,8
13	1	0,8
14	1	0,8
15	2	0,8
16	3	0,8
17	3	0,8

Rystelsesmåling

Max ladning per intervall: 0,20 kg

Denne salva har ingen måleverdier.

Øvrig informasjon

Planlagte tiltak

Området evakueres for folk. Salven varsles med sirene. Montert rystelsesmåler på nabohus. Dekkes med 2-3 lag skytematter.

Salvens forløp

Salven er visuelt kontrollert og alt gikk bra.

Informasjon om produktforbruk

Ingen kommentar til produktforbruk

Beregninger

Salvehull



Teoretiske verdier		Plan	Rapport	Diff
Antall hull	stk	19	22	3
Boremeter	m	15,2	17,6	2,4
Volum	m ³	7,6	8,5	0,9
Volum inkl. UB	m ³	8,7	9,7	1,0
Areal overside	m ²	10,9	12,2	1,3
Vekt (1,6 t/m ³)	tonn	12,2	13,6	1,4
Sprengstofforbruk	kg	8,3	4,5	3,8
Bunnladning	kg	1,9	2,2	0,3
Pipeladning	kg	5,5	2,3	3,3
Bulksprengstoff rundt bunnladning	kg	0,8	0,0	0,8
Spesifikk ladning	kg/m ³	1,09	0,52	0,56
Spesifikk ladning inkl. UB	kg/m ³	1,0	0,5	0,5
Max ladning pr int.	kg	0,4	0,2	0,2
Faktiske verdier				
Boremeter	m	-	17,6	-
Sprengstofforbruk ⁽¹⁾	kg	-	3,6	-
Spesifikk ladning ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,42	-
Spesifikk ladning inkl. UB ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,37	-
Densitet ⁽³⁾	kg/l	-	0,00	-
Avvik teori / faktisk				
Boremeter	m	-	0,9	-
Sprengstofforbruk	kg	-	0,10	-
Spesifikk ladning ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,09	-
Spesifikk ladning inkl. UB ⁽²⁾	kg/m ³	-		-


Fotnoter:

(1) - Faktisk sprengstofforbruk baserer seg på angitt produktforbruk hvor sprengstoffmengde er hentet fra et produktregister

(2) - Spesifikk ladning benytter teoretisk volum som divisor

(3) - Kun aktuelt dersom det benyttes bulk (anfo eller emulsjon) i pipeladning. Verdien baserer seg på angitte mengder bulksprengstoff fordelt på tilgjengelig hullvolum i pipeladning.

Posteplan

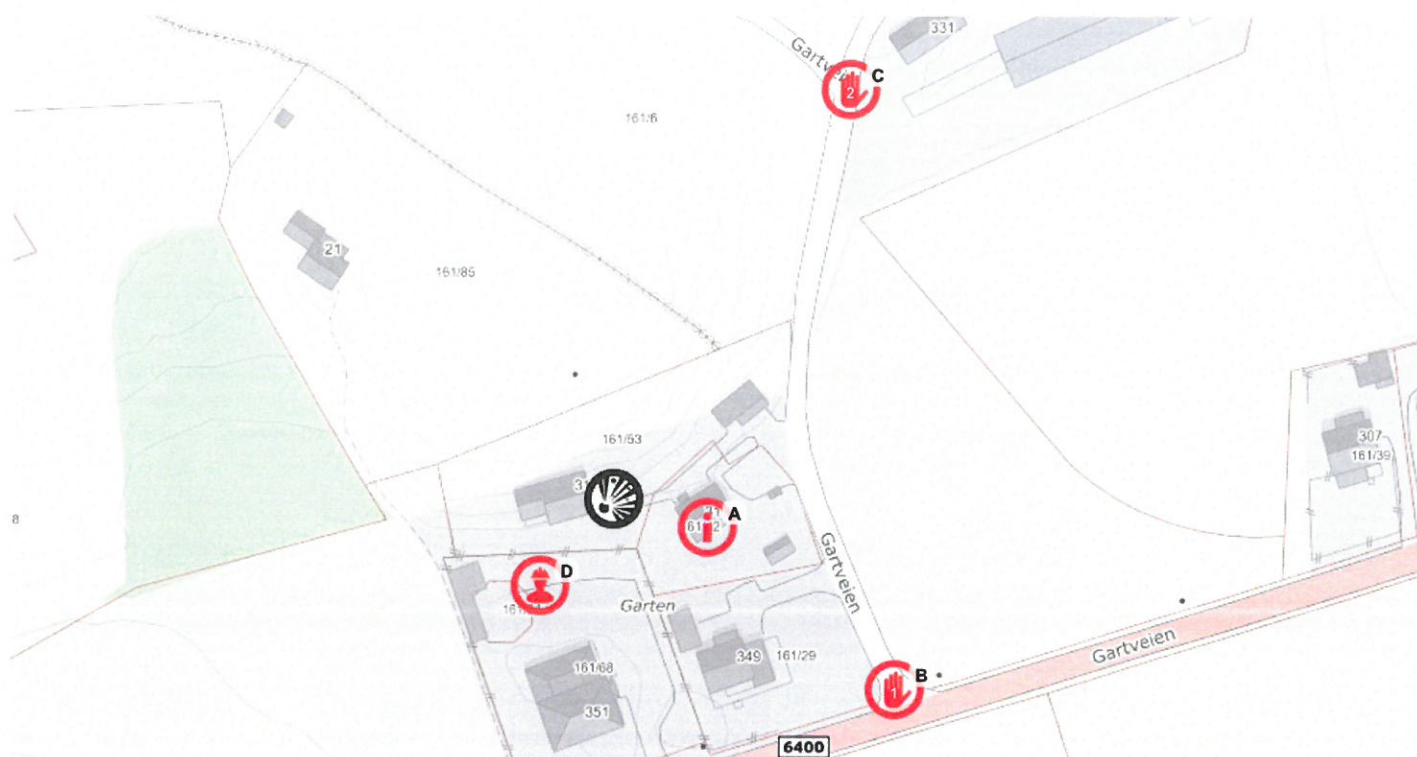

Referanse	Symbol	Instruks / Info	Person
A		Notat	
B		Post 1	
C		Post 2	
D		Bergsprenger	

Produktforbruk

Produkter

Varenr	Produktnavn	Mengde	Enhet
2401	Indetshock - 500 ms - 4,8 m	22,0	stk
2506	Koblingsblokk - 42	18,0	stk
2631	Starter - 50	1,0	stk
1317	Minex - Plastpølser - 43 x 550	3,6	kg

Boremeter

Borediameter	Beregnet/teoretisk Boremeter boremeter (m) fra rigg (m)	Differanse
38	17,6	0,0

SMS varslingslogg til naboer og berørte parter

Det er ikke sendt ut SMS varslingslogg til berørte parter.

Kastlengder

Retning	Vurdert	Registrert	Differanse
Front	5,0	0,0	-5,0
Bak	0,0	0,0	0,0
Venstre	0,0	0,0	0,0
Høyre	5,0	0,0	-5,0

Kastlengder gjelder etter tiltak er utført.

Tennerplan

Salve ID: 1334. Parsell: Ekstra salve for mur

42

