

Salverapport

Parsell: Tomt Garten
Sprengningsplan: Hoved
Salve ID: 1316
Salve Nr: 1
Bergsprenger: Joakim Dyrendal
GPS-posisjon: UTM33 Ø 228593,78 N 7068838,68
Planlagt skutt: 01.12.2020 10:15:00
Faktisk skutt: 09.12.2020 13:00:00
Salveplan opprettet: 01.12.2020 09:11:07
Salverapport opprettet: 09.12.2020 19:20:43
Revisjonstidspunkt: 09.12.2020 19:20:43
Revisjonsnummer: 1 / 1
Frie sider: Ingen

Kommentarer til revisjon:
Original salverapport

Salvedata

		Salvehull		
				
		Plan Rapport Avvik		
Borediameter	mm	54	54	0
Forsetning	m	1,20	1,20	0,00
Hullavstand	m	1,40	1,40	0,00
Underboring	m	0,80	0,80	0,00
Fordemming	m	1,40	1,40	0,00
Hull pr detonasjon	stk	1	1	0
Hullhelling	grader	0,0	0,0	0,0
Bunnladning				
Patrondimensjon	mm	40	40	0
Patronlengde	mm	500	500	0
Patronvekt	gram	1000	1000	0
Patroner pr hull	stk	0,3	0,3	0
Pipeladning				
Densitet	kg/l	0,85	0,85	0,00
Patronlengde	mm	0	0	0
Patronvekt	gram	0	0	0
Lengde mellomdekk	m	0,0	0,0	0,0

Hulldata

Salvehull		
		
Rast	Antall hull	Boreddybde
1	7	2,8
2	8	2,8
3	8	2,8
4	8	2,8
5	8	2,8
6	8	2,8
7	8	2,8
8	8	2,8
9	8	2,8
10	8	2,8

11	8	2,8
12	8	2,8
13	8	2,8
14	8	2,8
15	8	2,8
16	8	2,8
17	8	2,8
18	8	2,8
19	8	2,8
20	8	2,8
21	8	2,8
22	8	2,8
23	8	2,8
24	8	2,8
25	8	2,8
26	8	2,8

Rystelsesmåling

Max ladning per intervall: 2,73 kg

Denne salva har ingen måleverdier.

Øvrig informasjon

Planlagte tiltak

Området evakueres for folk. Salven varsles med sirene. Montert rystelsesmåler på nabohus. Dekkes med 2-3 lag skytematter.

Salvens forløp

Totalt skutt på denne tomten.

I tillegg ble det boret 17 m (lengdemeter) søm inntill huset a 1,65 m.

Det ble også boret ekstrahull mellom salvehullene på bakveggen for å prøve å få til en finere vegg.

Informasjon om produktforbruk

Ingen kommentar til produktforbruk

Beregninger

Salvehull

Teoretiske verdier		Plan	Rapport	Diff
Antall hull	stk	20	207	187
Boremeter	m	40,0	579,6	539,6
Volum	m ³	30,2	608,2	577,9
Volum inkl. UB	m ³	50,4	851,4	801,0
Areal overside	m ²	25,2	304,1	278,9
Vekt (1,6 t/m ³)	tonn	48,4	973,1	924,7
Sprengstofforbruk	kg	26,2	593,1	566,9
Bunnladning	kg	6,0	62,1	56,1
Pipeladning	kg	17,5	503,7	486,2
Bulksprengstoff rundt bunnladning	kg	2,6	27,3	24,6
Spesifikk ladning	kg/m ³	0,86	0,98	0,11
Spesifikk ladning inkl. UB	kg/m ³	0,5	0,7	0,2
Max ladning pr int.	kg	1,2	2,7	1,6
Faktiske verdier				
Boremeter	m	-	579,6	-
Sprengstofforbruk ⁽¹⁾	kg	-	420,0	-
Spesifikk ladning ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,69	-
Spesifikk ladning inkl. UB ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,49	-
Densitet ⁽³⁾	kg/l	-	0,59	-
Avvik teori / faktisk				
Boremeter	m	-	173,1	-
Sprengstofforbruk	kg	-	0,28	-
Spesifikk ladning ⁽²⁾	kg/m ³	-	0,20	-
Spesifikk ladning inkl. UB ⁽²⁾	kg/m ³	-		-


Fotnoter:

(1) - Faktisk sprengstofforbruk baserer seg på angitt produktforbruk hvor sprengstoffmengde er hentet fra et produktregister

(2) - Spesifikk ladning benytter teoretisk volum som divisor

(3) - Kun aktuelt dersom det benyttes bulk (anfo eller emulsjon) i pipeladning. Verdien baserer seg på angitte mengder bulksprengstoff fordelt på tilgjengelig hullvolum i pipeladning.

Posteplan

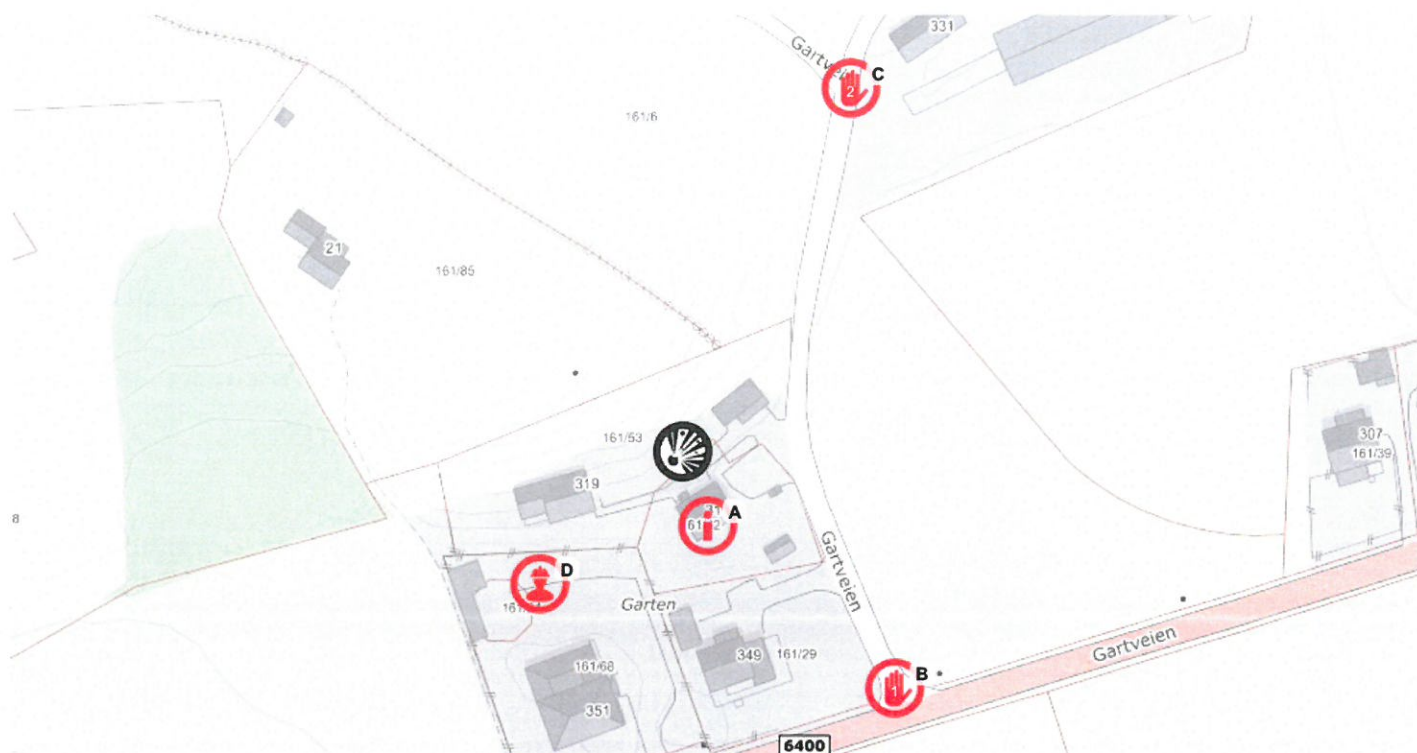

Referanse	Symbol	Instruks / Info	Person
A	 Notat		
B	 Post 1		
C	 Post 2		
D	 Bergsprenger		

Produktforbruk

Produkter

Varenr	Produktnavn	Mengde	Enhet
1204	Hydranex B - Småsekk	350,0	kg
2401	Indetshock - 500 ms - 4,8 m	207,0	stk
2503	Koblingsblokk - 17	73,0	stk
2504	Koblingsblokk - 25	41,0	stk
2506	Koblingsblokk - 42	150,0	stk
2631	Starter - 50	20,0	stk
1315	Minex - Plastpølser - 36 x 550	25,0	kg
-	Minex - Plastpølser - 40 x 550	20,0	kg
1317	Minex - Plastpølser - 43 x 550	25,0	kg

Boremeter

Borediameter	Beregnet/teoretisk Boremeter boremeter (m) fra rigg (m)	Differanse
60	579,6	579,6
		0,0

SMS varslingslogg til naboer og berørte parter

Det er ikke sendt ut SMS varsling til berørte parter.

Kastlengder

Retning	Vurdert	Registrert	Differanse
Front	5,0	15,0	10,0

Bak	5,0	0,0	-5,0
Venstre	5,0	5,0	0,0
Høyre	5,0	5,0	0,0

Kastlengder gjelder etter tiltak er utført.

Tennerplan

Salve ID: 1316. Parsell: Tomt Garten

42 17 25 2

