

HAGNES VVS AS

TEMPEVEGEN 19
POSTBOKS 6719
7490 TRONDHEIM

Telefon: 73 911955
Mobil: 901 20136

Bank: 9051.10.06952
E-post: firmapost@hagnes-vvs.no

FAKTURA**29920**

Fakturadato: 25.11.2020
Forfallsdato: 09.12.2020
Kundenummer: 15418

INDRE FOSEN KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK BJUGN
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

NO 963217226 MVA Foretaksregisteret



Deres ref.:	5POF Per Olav Foss	Vår ref.:	ARILD KULEN	Prosj.nr.:	12953	Prosj.adr.:	Rissa Helsetun, Årnsetflata 2, 7100 RISSA (Knr: 50		
Varenr.	Tekst				Enhet	Antall	Pris	Mva	Sum eks.mva
	ÅRLIG SERVICE 2020, RISSA HELSETUN								
	ÅRLIG SERVICE 2020				STK	1,00	3 500,00	25,00	3 500,00
	FORDELT REISE, BOM OG FERGE				STK	1,00	540,00	25,00	540,00

Sum eks.mva	MVA grunnlag	MVA kr.	Sum inkl. mva
4 040,00	4 040,00	1 010,00	5 050,00

Selger har i henhold til gjeldende pantelov panterett i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er helt betalt.
Etter forfall beregnes en rente på 9,25% pr. påbegynte måned.

9051.10.06952 5 050,00

09.12.2020

Fakturadato 25.11.2020
Fakturanr. 29920
Forfallsdato 09.12.2020
Kundenr. 15418

INDRE FOSEN KOMMUNE
FAKTURAMOTTAK BJUGN
ALF NEBBS GATE 2
7160 BJUGN

HAGNES VVS AS
TEMPEVEGEN 19
POSTBOKS 6719
7490 TRONDHEIM

5050 00 0 9051.10.06952

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no



Detaljert sjekklisterapport

Prosjekt: ÅRLIG SERVICE 2020, RISSA HELSETUN

Prosjektnummer: 12953

Kommune: Indre Fosen

Gnr./Bnr.: 122/67

Hagnes VVS AS

Postboks 6719 Org.nr: 963217226
7490 TRONDHEIM Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no



Innholdsfortegnelse

Gruppe ÅRSKONTROLL 2
Sjekkliste DIVERSE 3
Sjekkliste FLASKESKAP 4
Sjekkliste INNVENDIG RØRNETT 6
Sjekkliste KJØKKEN 8
Sjekkliste LEKKASJESØK 10

Hagnes VVS AS

Postboks 6719 Org.nr: 963217226
7490 TRONDHEIM Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no

Hagnes VVS as

Sjekkliste DIVERSE

Prosjekt ÅRLIG SERVICE 2020, RISSA HELSETUN
Sti ÅRSKONTROLL

Utskriftdato 06.11.2020

Beskrivelse							
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig , Morten Sivertsgård							
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-30 12:03	Faktisk slutt	2020-10-30 12:04	Status	100 %
Kommentarer							

Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Navn / adresse			2020-10-30 12:03	Morten Sivertsgård	Ok	RISSA HELSETUN	0
Dokumentasjon			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok	IKKE FREMLAGT DOKUMENTASJON	0
Nødvendig slukkestyr plassert			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Generell ryddighet gassanlegg			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Skilting og merking i orden			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Avlåst skap / tankdomer			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Sikkerhetsavstander overholdt			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Elektrisk utstyr i soneklassifisert område			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Bruker av gassanlegget er kjent med stengeprosedyrer			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Har det vært uhell / ulykker med gassanlegget det siste året			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ok		0
Merknader			2020-10-30 12:04	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM
Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no

Hagnes VVS as

Sjekkliste FLASKESKAP

Prosjekt: ÅRLIG SERVICE 2020, RISSA HELSETUN
Sti: ÅRSKONTROLL

Utskriftsdato: 06.11.2020

Beskrivelse							
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig: Morten Sivertsgård							
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-30 11:54	Faktisk slutt	2020-10-30 11:56	Status	100 %
Kommentarer							

Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Flaskeskap type			2020-10-30 11:54	Morten Sivertsgård	Ok	11KG FLASKESKAP	1
Beskyttelse rundt skap			2020-10-30 11:54	Morten Sivertsgård	Ok		0
Skap avlåst			2020-10-30 11:54	Morten Sivertsgård	Ok		0
Regulator type og trykk			2020-10-30 11:55	Morten Sivertsgård	Ok	MULLER 047	1
Sjekk av omskifter			2020-10-30 11:55	Morten Sivertsgård	Ok		0
Magnetventil			2020-10-30 11:55	Morten Sivertsgård	Ok		1
El utstyr i EX sone			2020-10-30 11:55	Morten Sivertsgård	Ok		0
Slanger			2020-10-30 11:55	Morten Sivertsgård	Ok		0
Rør type inn i bygning			2020-10-30 11:55	Morten Sivertsgård	Ok	IPRESS	0
Beskyttelse av gassfaserør			2020-10-30 11:56	Morten Sivertsgård	Ok		0
Ryddighet rundt skap			2020-10-30 11:56	Morten Sivertsgård	Ok		0
Tetthetsprøving			2020-10-30 11:56	Morten Sivertsgård	Ok		0
Merking av skap og ventiler			2020-10-30 11:56	Morten Sivertsgård	Ok		0
Merknad			2020-10-30 11:56	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0

Vedlegg

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse (kB)	Filtype
Flaskeskap type 1.jpg		2020-10-30 11:54	146.00	jpg
Regulator type og trykk. 1		2020-10-30 11:54	133.00	jpg
Magnetventil 1.jpg		2020-10-30 11:55	101.00	jpg

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no

Hagnes VVS as

Tittel Flaskeskap type 1.jpg Beskrivelse Opprettet 2020-10-30 11:54 	Tittel Regulator type og trykk. 1 Beskrivelse Opprettet 2020-10-30 11:54 
Tittel Magnetventil 1.jpg Beskrivelse Opprettet 2020-10-30 11:55 	

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no

Hagnes VVS as

Sjekkliste INNVENDIG RØRNETT

Prosjekt: ÅRLIG SERVICE 2020, RISSA HELSETUN
Sti: ÅRSKONTROLL

Utskriftsdato: 05.11.2020

Beskrivelse							
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig: Morten Sivertsgård							
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-30 12:06	Faktisk slutt	2020-10-30 12:21	Status	100 %
Kommentarer							

Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Innvendig stengeventil			2020-10-30 12:06	Morten Sivertsgård	Ok		1
Ubrukte ledninger, avstikk plugget			2020-10-30 12:10	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0
Rørtype som vist på tegning			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0
Skjulte røropplegg er heltrukket med kappe.			2020-10-30 12:06	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0
Utført tiltak hvor rør har skjøter under bakkenivå			2020-10-30 12:06	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0
Benyttet forrør i vegger og etasjeskiller			2020-10-30 12:21	Morten Sivertsgård	Ok	FORRØR MANDLER	0
Åpning mellom varerør og gassrør riktig tettet			2020-10-30 12:21	Morten Sivertsgård	Ok	FORRØR MANDLER	0
Ventiler foran alle forbrukere.			2020-10-30 12:10	Morten Sivertsgård	Ok		0
Gasslanger ikke lengere enn 1,5m og sikret mot skade			2020-10-30 12:10	Morten Sivertsgård	Ok		0
Alle skjøter er inspiserbare			2020-10-30 12:10	Morten Sivertsgård	Ok		0
Åpne rørføringer lagt mest mulig beskyttet.			2020-10-30 12:06	Morten Sivertsgård	Ok		0
Alle rør og ventiler godt merket			2020-10-30 12:06	Morten Sivertsgård	Ok		0
Riktig regulatorer for innvendig bruk.			2020-10-30 12:10	Morten Sivertsgård	Ok	REGULATOR ER PLASSERT I FLASKESKAP	0
Merknad			2020-10-30 12:10	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0

Vedlegg

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse (kB)	Filtype
Innvendig stengeventil 1.jpg		2020-10-30 12:05	71.00	jpg

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no

Hagnes VVS as

Tittel	Innvendig stengeventil 1.jpg
Beskrivelse	
Opprettet	2020-10-30 12:05
	

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM

Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no

Hagnes VVS as

Sjekkliste KJØKKEN

Prosjekt ÅRLIG SERVICE 2020, RISSA HELSETUN
Sti ÅRSKONTROLL

Utskrift dato 06.11.2020

Beskrivelse							
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig , Morten Sivertsgård							
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-30 12:01	Faktisk slutt	2020-10-30 12:11	Status	100 %
Kommentarer							

Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Utstyr, type, effekt			2020-10-30 12:01	Morten Sivertsgård	Ok	METOS 25,1 KW	1
CE merket utstyr, gasskategori			2020-10-30 12:01	Morten Sivertsgård	Ok		0
Stengeventil foran utstyr			2020-10-30 12:10	Morten Sivertsgård	Ok		0
Slange			2020-10-30 12:02	Morten Sivertsgård	Ok		0
Rør og oppheng			2020-10-30 12:02	Morten Sivertsgård	Ok		0
Riktig trykk til forbruker			2020-10-30 12:02	Morten Sivertsgård	Ok	30MBAR	0
Funksjonstestet			2020-10-30 12:11	Morten Sivertsgård	Ok		0
Sikkerhetsfunksjoner testet			2020-10-30 12:11	Morten Sivertsgård	Ok		0
Hovedbryter for propan montert.			2020-10-30 12:03	Morten Sivertsgård	Ok		1
Skilting og merking			2020-10-30 12:03	Morten Sivertsgård	Ok		0
Merknader.			2020-10-30 12:11	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0


Vedlegg

Tittel	Beskrivelse	Opprettet	Størrelse (kB)	Filtype
Utstyr, type, effekt 1.jpg		2020-10-30 12:00	86.00	jpg
Hovedbryter for propan montert. 1		2020-10-30 12:03	62.00	jpg

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM
Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no

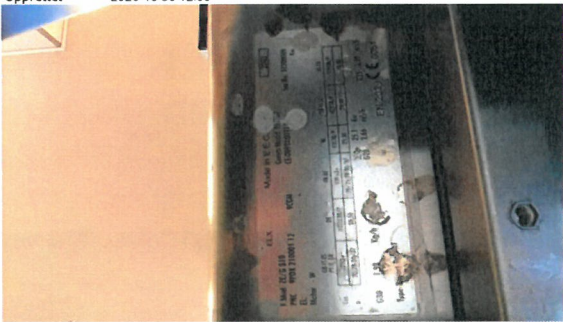

Tittel Beskrivelse Opprettet	Utstyr, type, effekt 1.jpg 2020-10-30 12:00	Tittel Beskrivelse Opprettet	Hovedbryter for propan monteret. 1 2020-10-30 12:03
			

Hagnes VVS AS

Postboks 6719
7490 TRONDHEIM
Org.nr: 963217226
Telefon: +47 73 91 19 55
firmapost@hagnes-vvs.no



Sjekkliste LEKKASJESØK

Prosjekt ÅRLIG SERVICE 2020, RISSA HELSETUN
Sti ÅRSKONTROLL

Utskrift dato 06.11.2020

Beskrivelse							
Siste oppdaterte referanser							
Ansvarlig	, Morten Sivertsgård						
Planlagt start	Planlagt slutt	Faktisk start	2020-10-30 12:12	Faktisk slutt	2020-10-30 12:12	Status	100 %
Kommentarer							

Sjekkpunkter

Tittel	Beskrivelse	Referanser	Faktisk slutt	Lukket av	Status	Kommentarer	Bilder
Beskrivelse av tetthetsprøvd seksjon			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ok	IFRA FLASKESKAP OG FREM TIL GASSBLUSS	0
Tillatt maksimum arbeidstrykk			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ok	30MBAR	0
Trykk ved prøving, bar			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ok	30MBAR	0
Prøvemedium			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ok	PROPAN	0
Holdetid fullt trykk			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ok	OK	0
Lekkasjeopplettmetode			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ok	SÅPEVANN OG DETEKTOR	0
Resultat (aksept / ikke aksept)			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ok	AKSEPT	0
Merknad			2020-10-30 12:12	Morten Sivertsgård	Ikke relevant		0

