

Fra: Morten Stene (Morten.stene@lokke.com)

Sendt: 09.11.2020 08:29:17

Til: Aune Erlend

Kopi: Tore Crister Løkke

Emne: SV: Kart VA-ledninger

Vedlegg: Prinsippskisse ettersending.pdf

Hei!

Prøvegravinger lengre mot huset viser fast berg under ca 30 cm. vegetasjonsdekke. Vi antar at denne går lengre ned og rørgrøftene ligger i sprengt grøft eller en naturlig nedsenkning.

Vedlagt ligger en prinsippskisse der vi ser for oss 2 mulige scenarier. Den første er med løsmasser til UK rør. Da vil det være mulig å anlegge en sjeté direkte på berg eller på løsmasser UK rør slik Martin beskriver. Ved tilfelle nr. 2 er det sprengt grøft og berget er noen titalls centimeter under eksisterende terreng. Da vil vi legge fyllingen direkte på berggrunnen og dermed ikke belaste rørgrøften i det hele tatt.

Vi er positiv til dialog med driftsavdelingen slik at vi kan ta en felles befarig eller oversende bilder av grunnen før fyllingsarbeidet starter opp.

Med vennlig hilsen

Morten Stene

Anleggsleder



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 454 89 264

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: morten.stene@lokke.com

Fra: Aune Erlend <Erlend.Aune@afjord.kommune.no>

Sendt: fredag 6. november 2020 07:49

Til: Morten Stene <Morten.stene@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>

Emne: VS: Kart VA-ledninger

Se eposter fra Martin Arnevik.

Får dere til å følge anbefalingene fra Martin? Kommer til å stille vilkår i at dere anlegger fyllingen i samråd med Martin og co på driftsbygget om det er greit for dere.

Kommer totalt to stykker.

Med hilsen



Erlend Aune

Avdelingsingeniør

erlend.aune@afjord.kommune.no

479 00 303 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Arnevik Martin <Martin.Arnevik@afjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 5. november 2020 14:53

Til: Aune Erlend <Erlend.Aune@afjord.kommune.no>


Emne: SV: Kart VA-ledninger


Heisann!!

Jeg har ikke så mye erfaring på dette området, men jeg mener:

Skal vi kunne grave oss ned på rørene en gang i fremtiden, bør fyllingsfoten starte på samme nivå som vannledningene, vertfall ikke så mye høyere enn rørene. Se prinsippskisse under.

Svart er eksisterende, blått er nytt terreng.

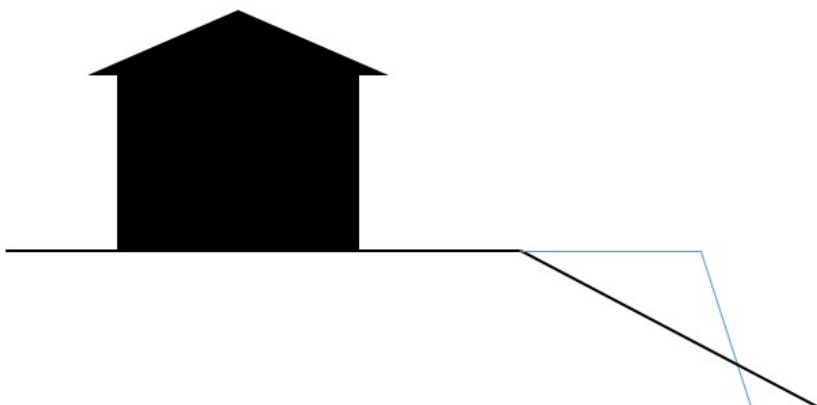



Skjønner du hva jeg mener??



Martin Arnevik

Driftsleder VVA

martin.arnevik@afjord.kommune.no

48 99 24 79 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Aune Erlend

Sendt: torsdag 5. november 2020 13:56

Til: Arnevik Martin <Martin.Arnevik@afjord.kommune.no>

Emne: VS: Kart VA-ledninger

Hei.

Magne vil ikke ha noe med saken her å gjøre, kan du si noe om fyllingsfoten er grei?

Avstander fra ledningene til fyllingsfoten, fått i epost fra Morten Stene:

På kartet du sendte over har jeg målt 9,5 meter (19mm på kartet) fra senter veg til det punktet som går lengst inn på tomte. Dermed blir den minste avstanden 2,5 meter fra rørene til fyllingsfoten på det smaleste. På nord-østsiden har jeg ikke tegnet inn ledningene ettersom de ligger på motsatt side av nettstasjonen og garasjen.

Tror kanskje han har brukt feil målestokk. Får til 4,5 meter fra fyllingsfot til ledning der han har målt.

Får du til å komme med en uttalelse i uka her.

Med hilsen



Erlend Aune

Avdelingsingeniør

erlend.aune@afjord.kommune.no

479 00 303 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Morten Stene <Morten.stene@lokke.com>

Sendt: torsdag 5. november 2020 12:32

Til: Aune Erlend <Erlend.Aune@afjord.kommune.no>

Kopi: Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>

Emne: SV: Kart VA-ledninger

Hei!

Vedlagt ligger situasjonsplan med inntegnet VA-ledninger og fyllingsfot. VA-ledningene er målt fra senter veg på kartet du sendte og tegnet inne fra senter veg på situasjonsplanen. Håper dette svarer ut etterspurt informasjon. Ta gjerne kontakt igjen dersom noe er uavklart.

Ha en fin dag videre!

Med vennlig hilsen

Morten Stene

Anleggsleder



Sentrallbord: 72 53 40 50 | mobil: 454 89 264

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: morten.stene@lokke.com

Fra: Aune Erlend <Erlend.Aune@afjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 5. november 2020 11:28

Til: Morten Stene <Morten.stene@lokke.com>

Emne: Kart VA-ledninger

Hei!

Sender som avtalt kart. Det er nok de samme opplysninger du har fått fra Martin.

Med hilsen



Erlend Aune

Avdelingsingeniør

erlend.aune@afjord.kommune.no

479 00 303 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.
