


Kryssing 1 , fylkesvei 715


ved Kvernlandsharsen, Steinsdalsveien 1150 med retningsbestemt boring. 30 m med 2x125 mm rør hvor ett rør blir ledig og 1 rør trekkes det inn en lavspenkabel TFXP 240AL. Lagerplass for rør angitt med koordinater.

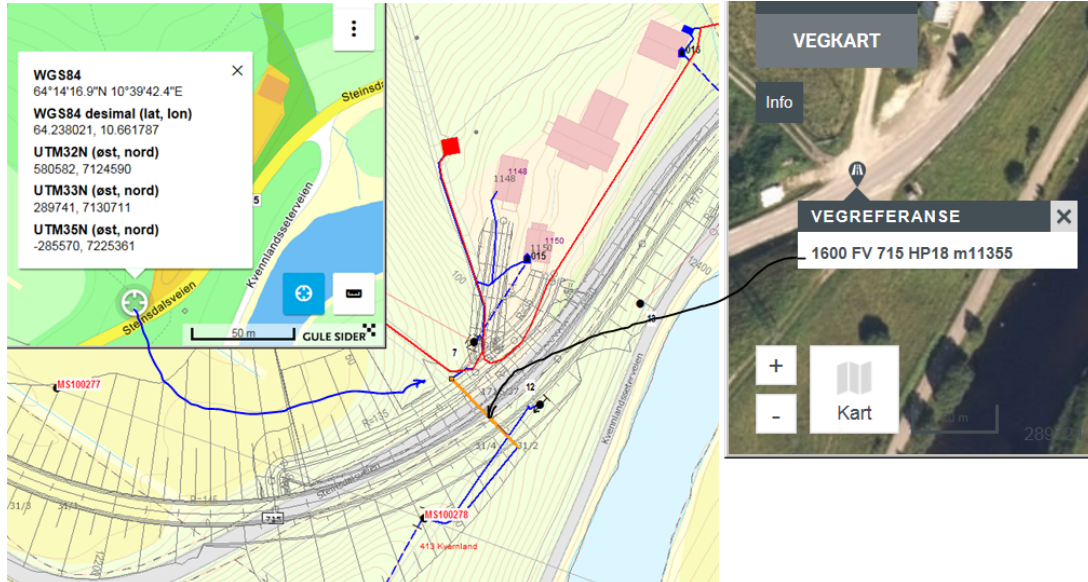

Veikryssing 2:


Er ved Torgeir Haugen, Steinsdalsveien 1206. Lagerplass for rør angitt i kart nedenfor.

Gjennom vei bores det for 2 stk. 125mm rør à 35 m. 1 rør for 240 AL lavspenkabel og det andre for 22 kV høyspenkabel TSLF 3x1x95AL

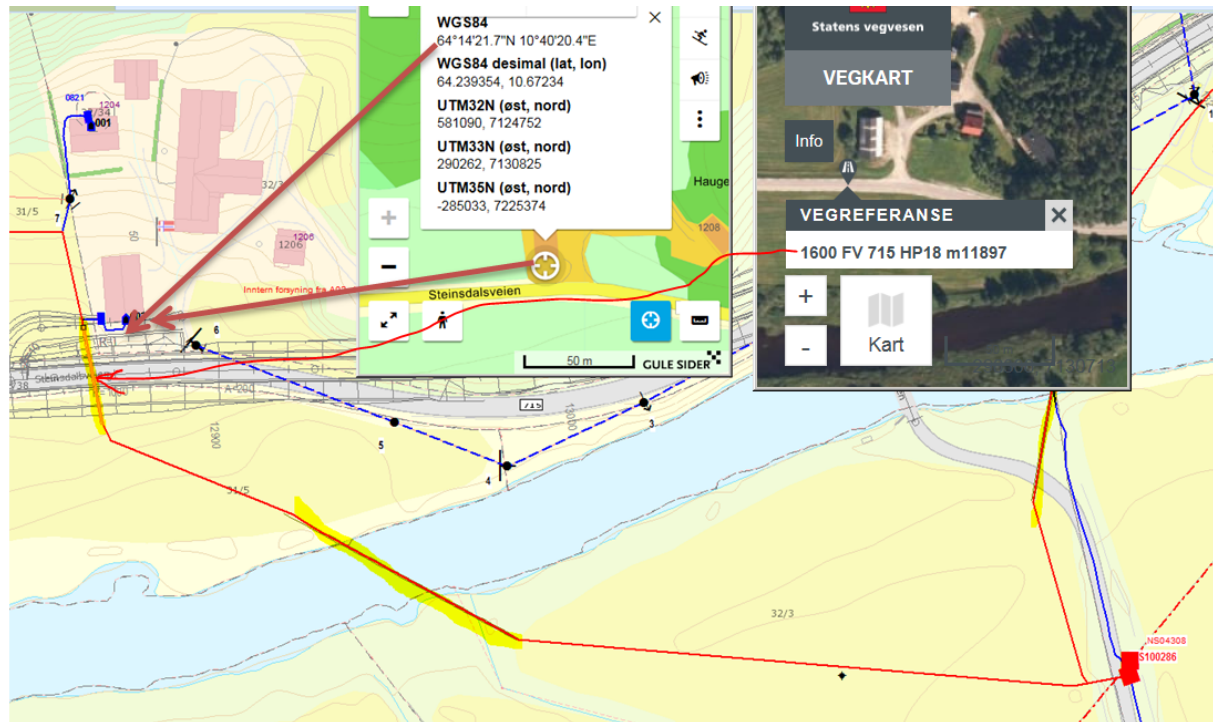


Elvekryssing 1 er ved Torgeir Haugen og er med 2 stk. 125 mm rør à 80 m.

Elvekryssing 2 er østenfor bro Rokkelnesveien med 1 stk. 125 mm rør på 90 m.

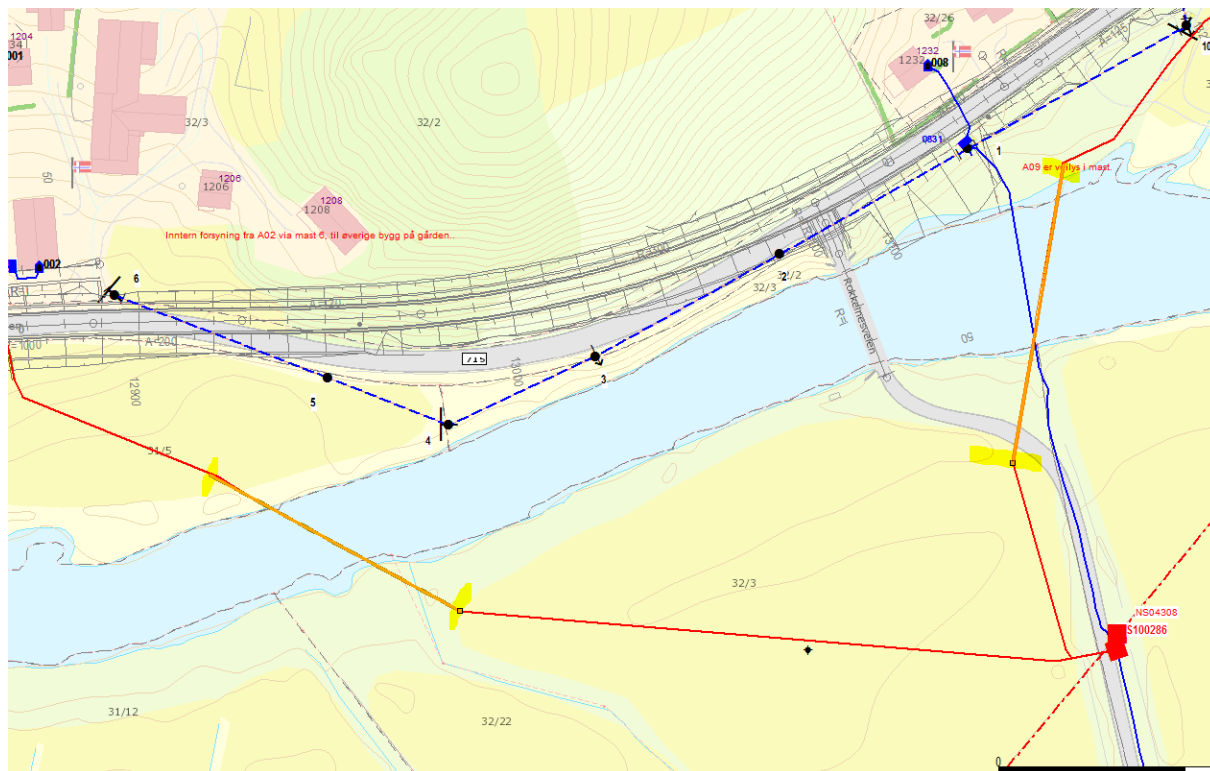

Sammenstilling TEN sitt behov:

Sted	Rørdiameter	Mengde i meter
Veikryssing 1, Harsen	125 mm	60
Veikryssing 2, ved Torgeir Haugen	125 mm	70
Elvekryssing 1, ved Torgeir Haugen	125 mm	160
Elvekryssing 2, øst for bro Rokkelnesveien.	125 mm	90
Sum:		380

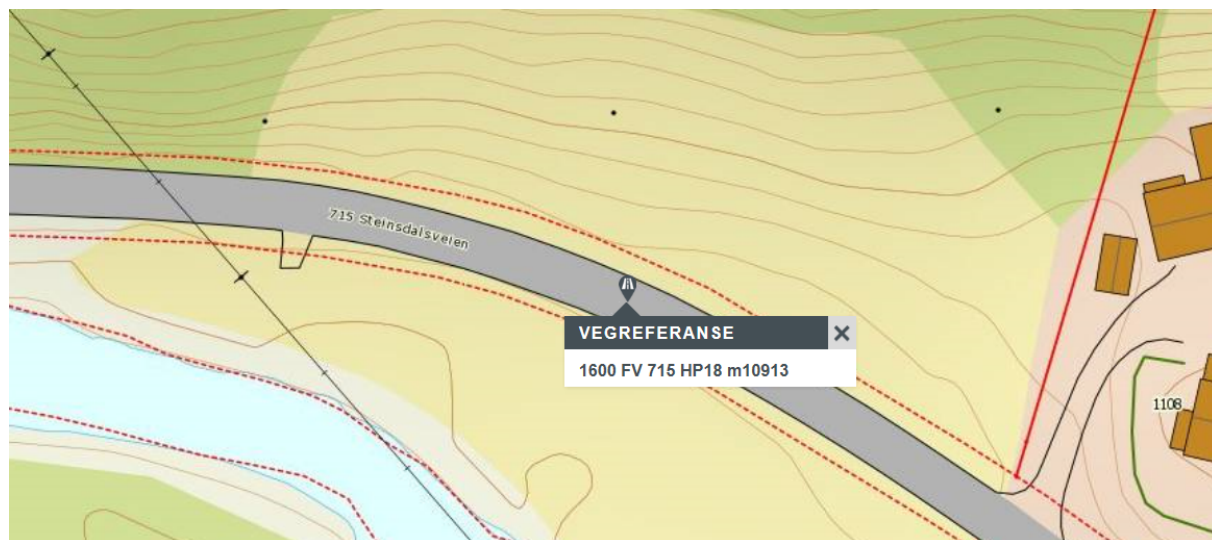[illegible]

Per Osen
